

Formulaire pour la conception de GrandPark

*Documentation obligatoire

* Clients

* Date

* Lieu

* Nom du projet

Observation

* Documentation graphique à fournir:
Essentiel - Plan de mise en oeuvre des modules
ombrières et fiche technique du panneau.





* Nombre total de modules: Taille de module: Longueur mm (Valable uniquement pour 1722/1762 mm)
Largeur mm (Valable uniquement pour 1134 mm)

* Nombre de place de parking: Conditions de conception Selon la fiche technique

Hauteur





Configurations disponibles :

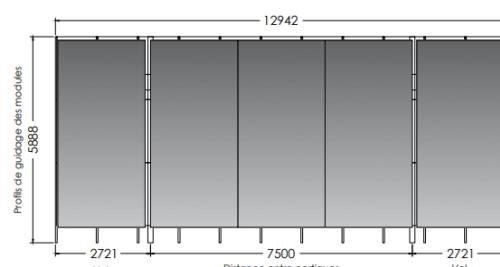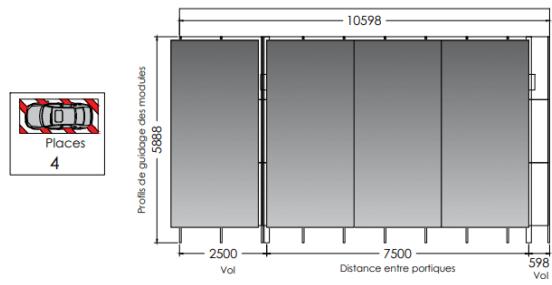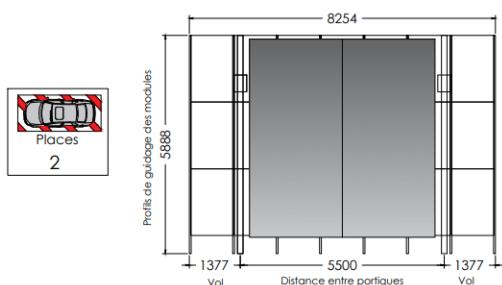


Exemple de configuration :


10 places



8 places



7 places



Calcul et dimensionnement des fondations

Pour les projets spéciaux, et afin de réaliser une conception adéquate des fondations, il sera obligatoire de fournir l'étude géotechnique correspondante du terrain.

Toute modification impliquant une nouvelle conception ou un nouveau calcul des fondations sera évaluée par le département technique, qui déterminera la faisabilité de la modification et, le cas échéant, les ajustements nécessaires à apporter à la conception structurelle.

Information général

- Si les conditions requises ne sont pas spécifiées, l'étude sera réalisée avec les calculs et les conditions de conception des produits standard. Pour les autres conditions de conception, le client doit fournir toutes les informations nécessaires requises par Enstall.
- Exigences pour l'installation dans les parkings :
 - Les dimensions des semelles ont été obtenues pour une valeur arbitraire des sols indiquée dans la documentation technique.
 - Les essais nécessaires doivent être effectués pour obtenir les caractéristiques de résistance du sol. Ceux-ci doivent être obtenus par le client ou sous sa responsabilité.
 - La fondation, en fonction de la disponibilité et de la variabilité du sol, peut être modifiée sous la supervision d'un technicien compétent.
 - La pente maximale admissible du sol pour une solution standard est de 2 %, pour des pentes supérieures, consultez Enstall.
 - Toutes les instructions de montage et les spécifications du produit fournies par Enstall doivent être respectées.
 - Le démontage des supports s'effectue dans l'ordre inverse du montage.



Effacer champs
